



数字化集成解决方案开发流程，重构中药材板块IT规划



中国领先的华为系管理咨询服务商

目录

CONTENTS

1

中药材板块IT规划

--- “三阶十二步” 贯穿IT规划全过程

2

云南白药数字化集成解决方案开发流程

---基于4A架构，实现IT产品全生命周期管理

3

顾问资源投入保障


---云南白药变革项目模块报价及资源规划

01

中药材板 块IT规划



基于“三阶十八步”完成中药板块IT规划

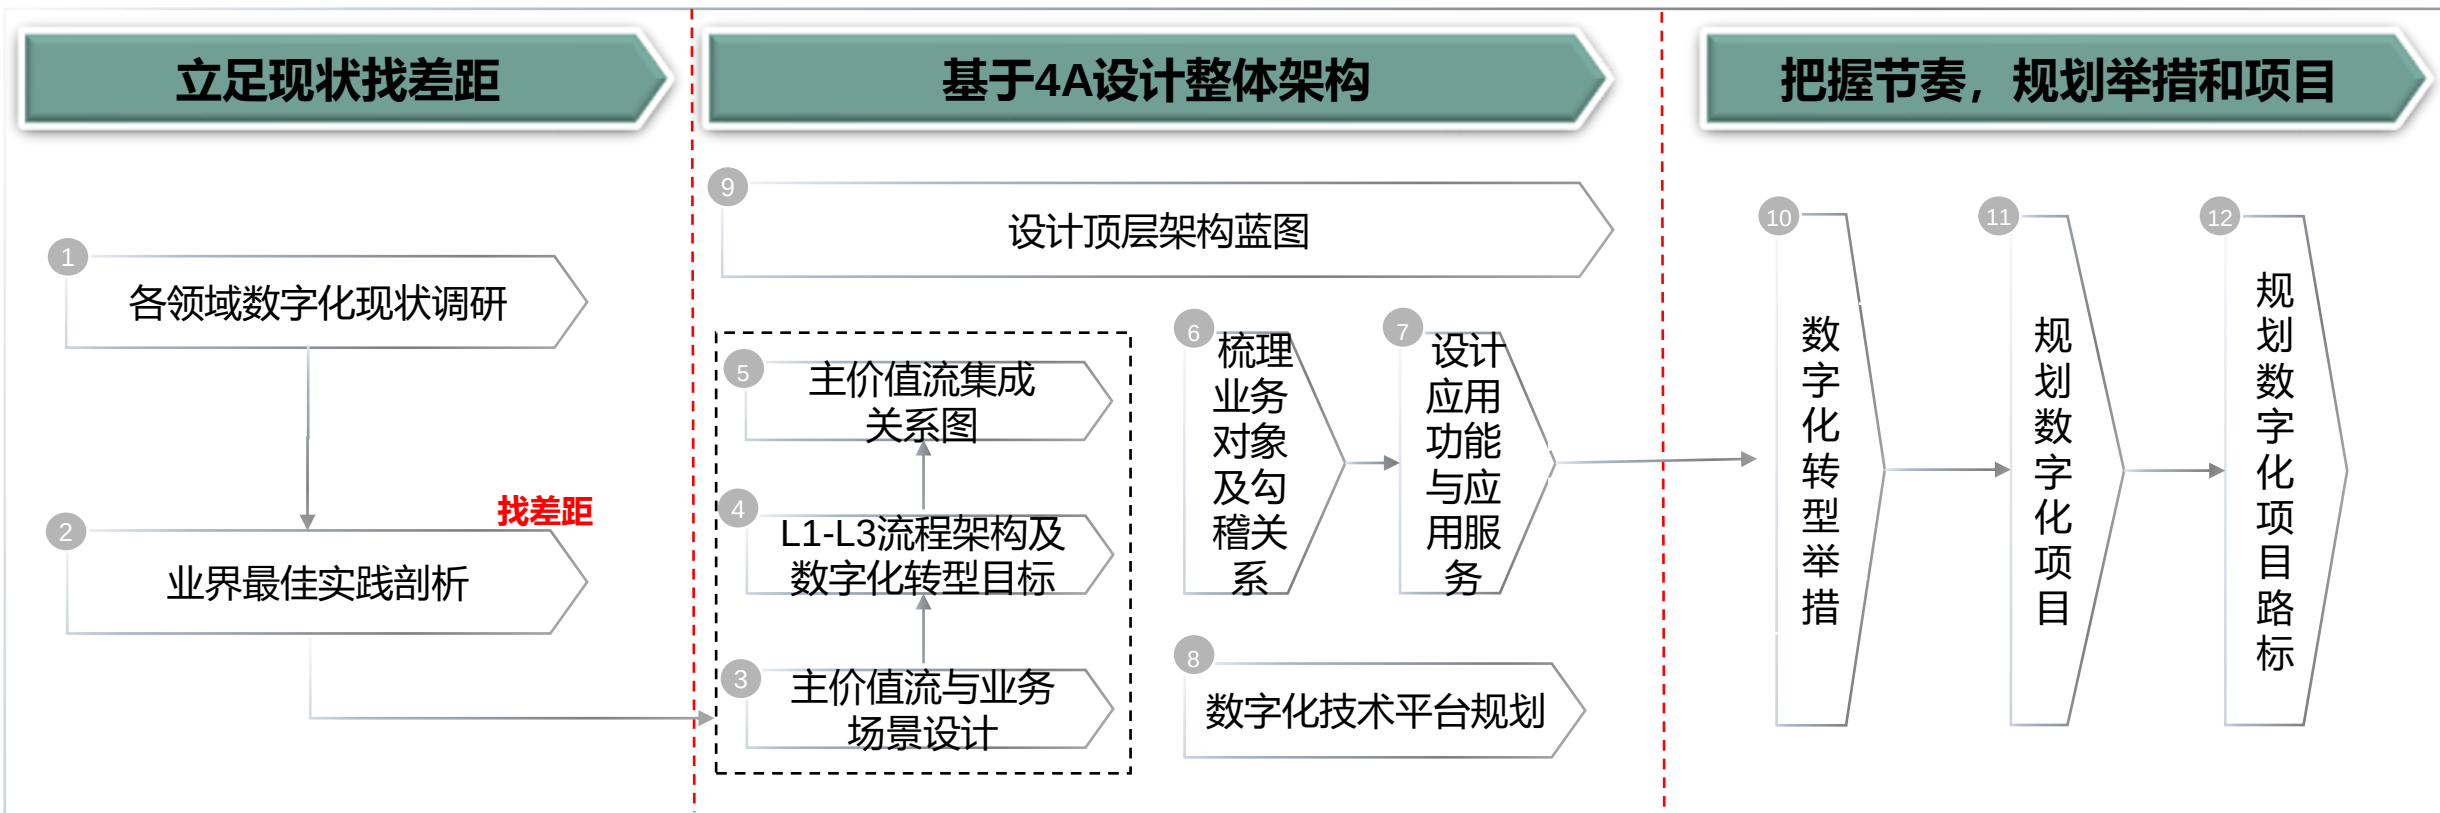

第一阶段：4月18日-4月19日

第二阶段：5月6日-5月10日

第三阶段：5月13日-5月17日

- 整体规划按照4A架构的方法进行详细设计
- 下列框架图展示均为示例

各领域数字化现状调研，核心要抓住问题的主要矛盾以及矛盾的主要方面

系统性调研、诊断

文档资料

会议研讨输出

访谈纪要

现场交流

顾问评估

关键问题发现与核心差距识别

问题的根因分析

当前急需解决的数字化问题

如何提升数字化能力

改进方向

管理类问题


流程类问题

组织类问题

IT类问题

数据类问题


业界实践剖析，识别中药材板块数字化能力亟待提升

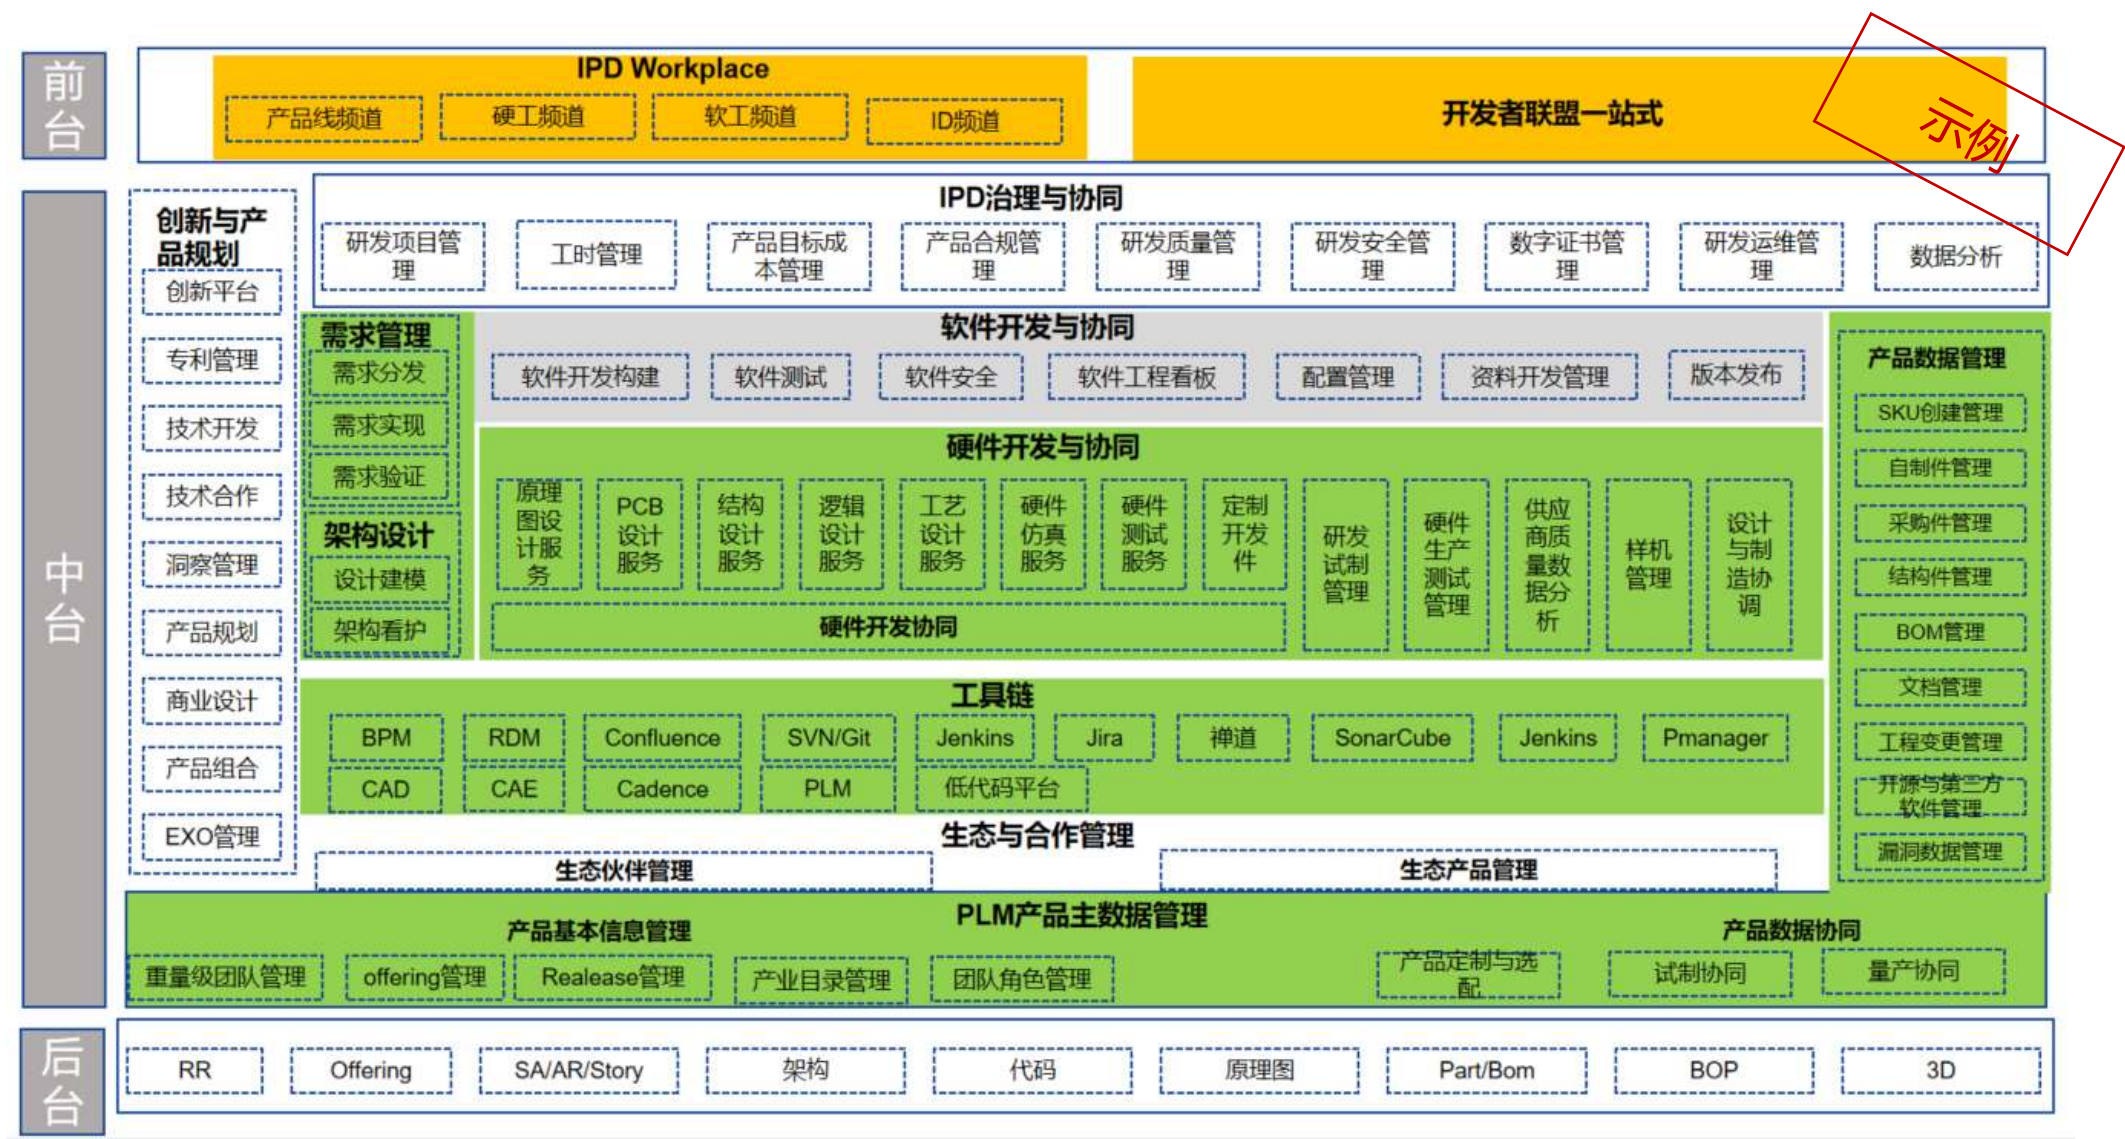

识别客户触点，做深客户联接，重构云南白药与客户生意交互的价值流



对准价值实现，构建以客户为中心的业务场景

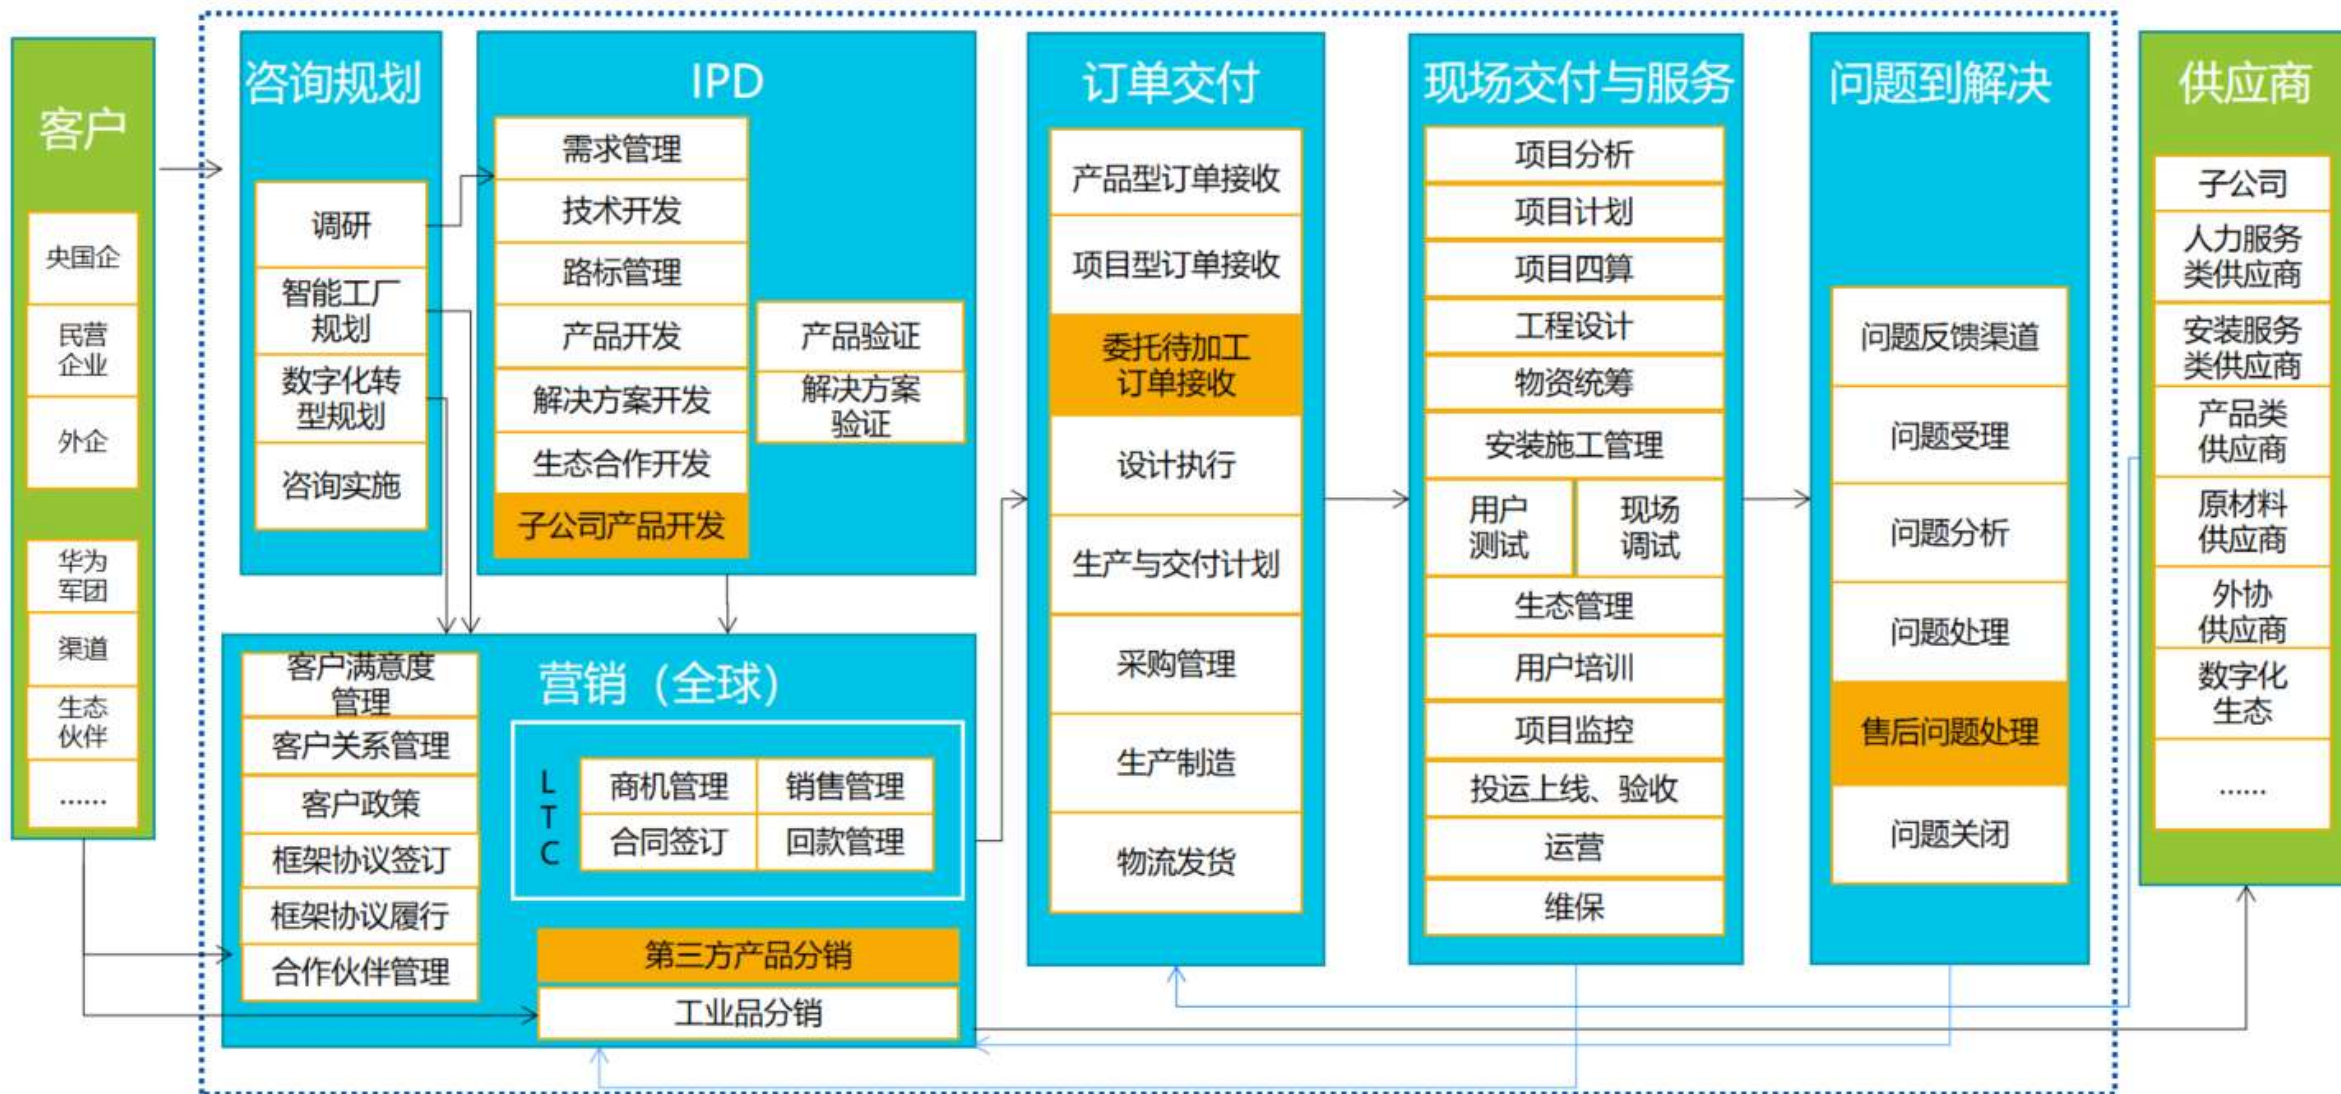


基于主价值流和业务场景设计，确定L1-L3流程架构，识别运营、支撑、使能、调用流程，拟定中药材板块IT规划目标

佰世方略
流程管理成就时代企业

示例

L1	2.0LTC	3.0IPD	6.0ISC	7.0D&S	9.0HRM	10.0财经	11.0BP&DT	14.0MCR	18.0工自仪	智能制造	咨询
	线索管理	管理需求	管理计划	工程交付与服务战略规划	HR战略规划	管理财务运作	管理数字化战略	管理客户战略及政策	市场营销MKT	智能制造规划	调研
	管理机会点	管理产品与组合	管理采购	设计、部署与系统集成	文化管理	管理税务	管理数字化变革	管理客户关系	集成营销与销售	管理产能规划与实施	智能工厂规划
	管理销售合同执行	管理开发与生命周期	管理订单	工业软件交付	组织管理	管理资金	管理业务架构与流程	管理客户接触与沟通	管理合同与订单	管理NPI	数字化转型规划
L2	管理客户技术方案	管理平台与技术	管理制造	成套交付	人才管理	管理销售融资	管理数据	管理客户满意度	客户服务	管理制造工艺	咨询实施
	管理授权和行权	管理项目	管理物流	咨询服务	干部管理	管理结账与合并	管理数字化解决方案	管理客户信息	管理计划	管理智能制造	
	管理行业运作	管理产品数据	管理供应链运营	信息安全服务	招聘管理	管理报告	管理数字化产品研发		商品运营	管理智能制造运营	
	管理销售项目	管理研发		运营服务	培训管理	管理子公司财经	管理数字化支撑与服务		管理采购		
	管理销售合同生命周期	管理上市		管理其他交付物	绩效管理	管理财经事务			管理物流		
	管理5S店运营	管理供应链视图		交付项目管理	薪酬激励管理	管理定价			财务管理		
		管理工程服务视图		交付资源管理	人事服务管理	管理全面预算			综合管理		
		管理质量视图		管理工程生态	员工关系管理	管理经营规则			管理IT平台		
		管理IPD支撑		管理工程平台&工具	对外培训	管理业务财务					
				管理工程运营质量		管理项目经营					
				管理后服务							
注：本图不含L3、L4流程											缺失
											待优化
											已有

根据主价值流和流程框架，设计各个主价值流之间的集成关系

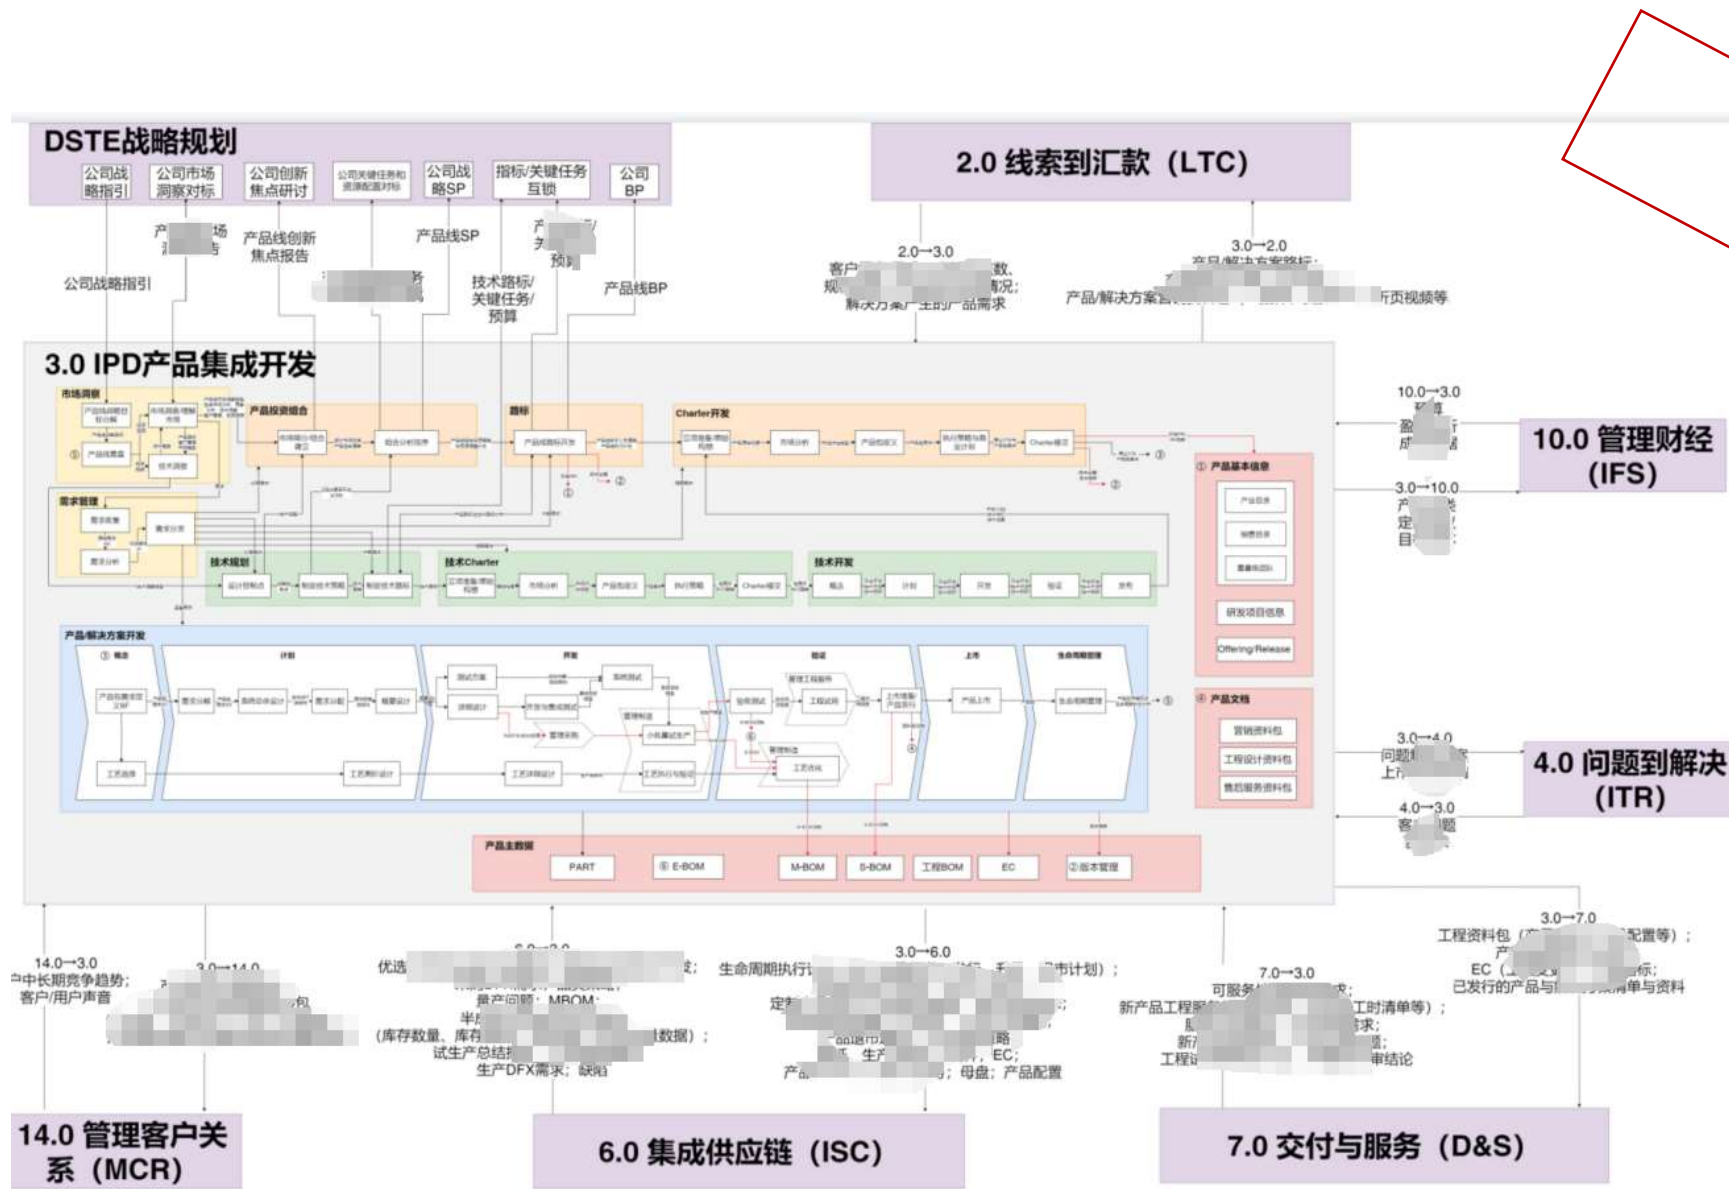

数据资产目录：理清云南白药数据资产




通过数据资产目录形成完善的云南白药数据资产地图，能为企业数据治理、业务变革提供了指引。基于云南白药数据资产目录可以识别数据管理责任，解决数据问题争议，帮助中控更好地对业务变革规划设计，避免重复建设

架构层级	定义	11大主题域分组 (L1)	100大主题域 (L2)	638个业务对象 (L3)
L1 主题域分组		LTC/MCR	客户 线索 机会点 合同 销售预测 (共6个)	客户信息、线索项目、合同信息 (共16个)
		ISC	管理计划 管理订单 管理采购 管理物流 (共4个)	仓库、生产订单、采购订单、库存计划 (共88个)
		IPD	产品规划与生命周期管理 开发管理 项目管理 技术管理 (共5个)	产品信息、研发项目集、技术预研 (共57个)
L2 主题域		D&S	项目规划 总体设计 投运上线 售后 (共21个)	工程项目信息、项目变更、安装信息、验收信息 (共84个)
		HRM	招聘 绩效 薪酬与激励 培训 (共13个)	人力资源战略、组织基本信息、绩效评价、人才画像 (共88个)
		财经运营	费用 资产 收入 投资 (共14个)	固定资产、关联应付、所得税、资金、应付账款 (共110个)
		智能制造	管理智能制造规划 管理产能规划 管理NPI (共6个)	生产图纸、工艺路线、设备备件、生产安全 (共32个)
L3 业务对象		S2B	商品 合同 销售 服务 (共10个)	SKU、商机、供应商、备件领用单、合同、询价单 (共64个)
		IT	数字化需求 企业架构 信息安全 IT运维 (共9个)	数字化蓝图、IT问题、数字化项目 (共33个)
		数据	数据战略 数据管理 数据基础建设 数据技术能力建设 (共5个)	数据战略框架、主数据管理 (共29个)
		国际化	运营 LTC 工程交付 财经 (共7个)	经营规则、市场洞察、汇率管理 (共37个)


由资深业务代表，识别业务对象，基于数据流完成业务对象间的勾稽关系




主题域组	IPD集成产品开发(56个)				
主题域	产品规划与生命周期管理	开发管理	项目管理	技术管理	运营分析
业务对象	细分市场洞察	研发设计需求	研发项目集	技术基本信息	研发能力分析
	原始需求RR	系统	研发项目里程碑	技术开发项目	经营能力分析
	初始需求IR	子系统	研发项目风险	技术预研	研发项目分析
	版本特性SF	CBB	研发项目问题	技术Charter	
	产品基本信息	功能模块	研发项目变更	技术资料	
	解决方案基本信息	接口	研发外包人员	技术版本	
	产品与解决方案Charter	Part	研发配置管理		
	产品版本	E-BOM	产品质量保证		
	解决方案版本	研发文档	研发项目合同		
	产品变更	测试用例	重量级团队		
	服务产品基本信息	缺陷	产品开发项目		
	服务产品版本	研发代码	产品解决方案开发项目		
	服务产品Charter	产品资料	服务产品开发项目		
		产品配置			
		产品与解决方案试用			
		产品与解决方案目标成本管控			
		解决方案配置			
		解决方案资料			
		服务产品配置			
		服务产品资料			
		S-BOM			

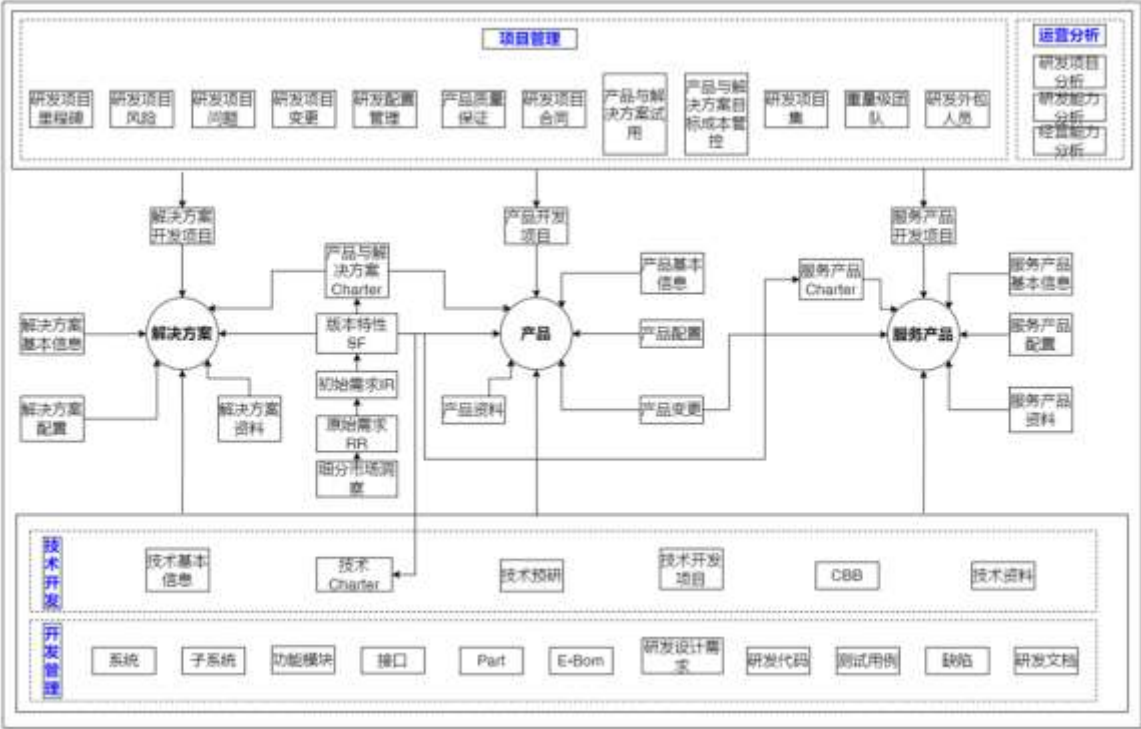

基于业务对象，识别相关应用功能模块，形成云南白药整体应用架构

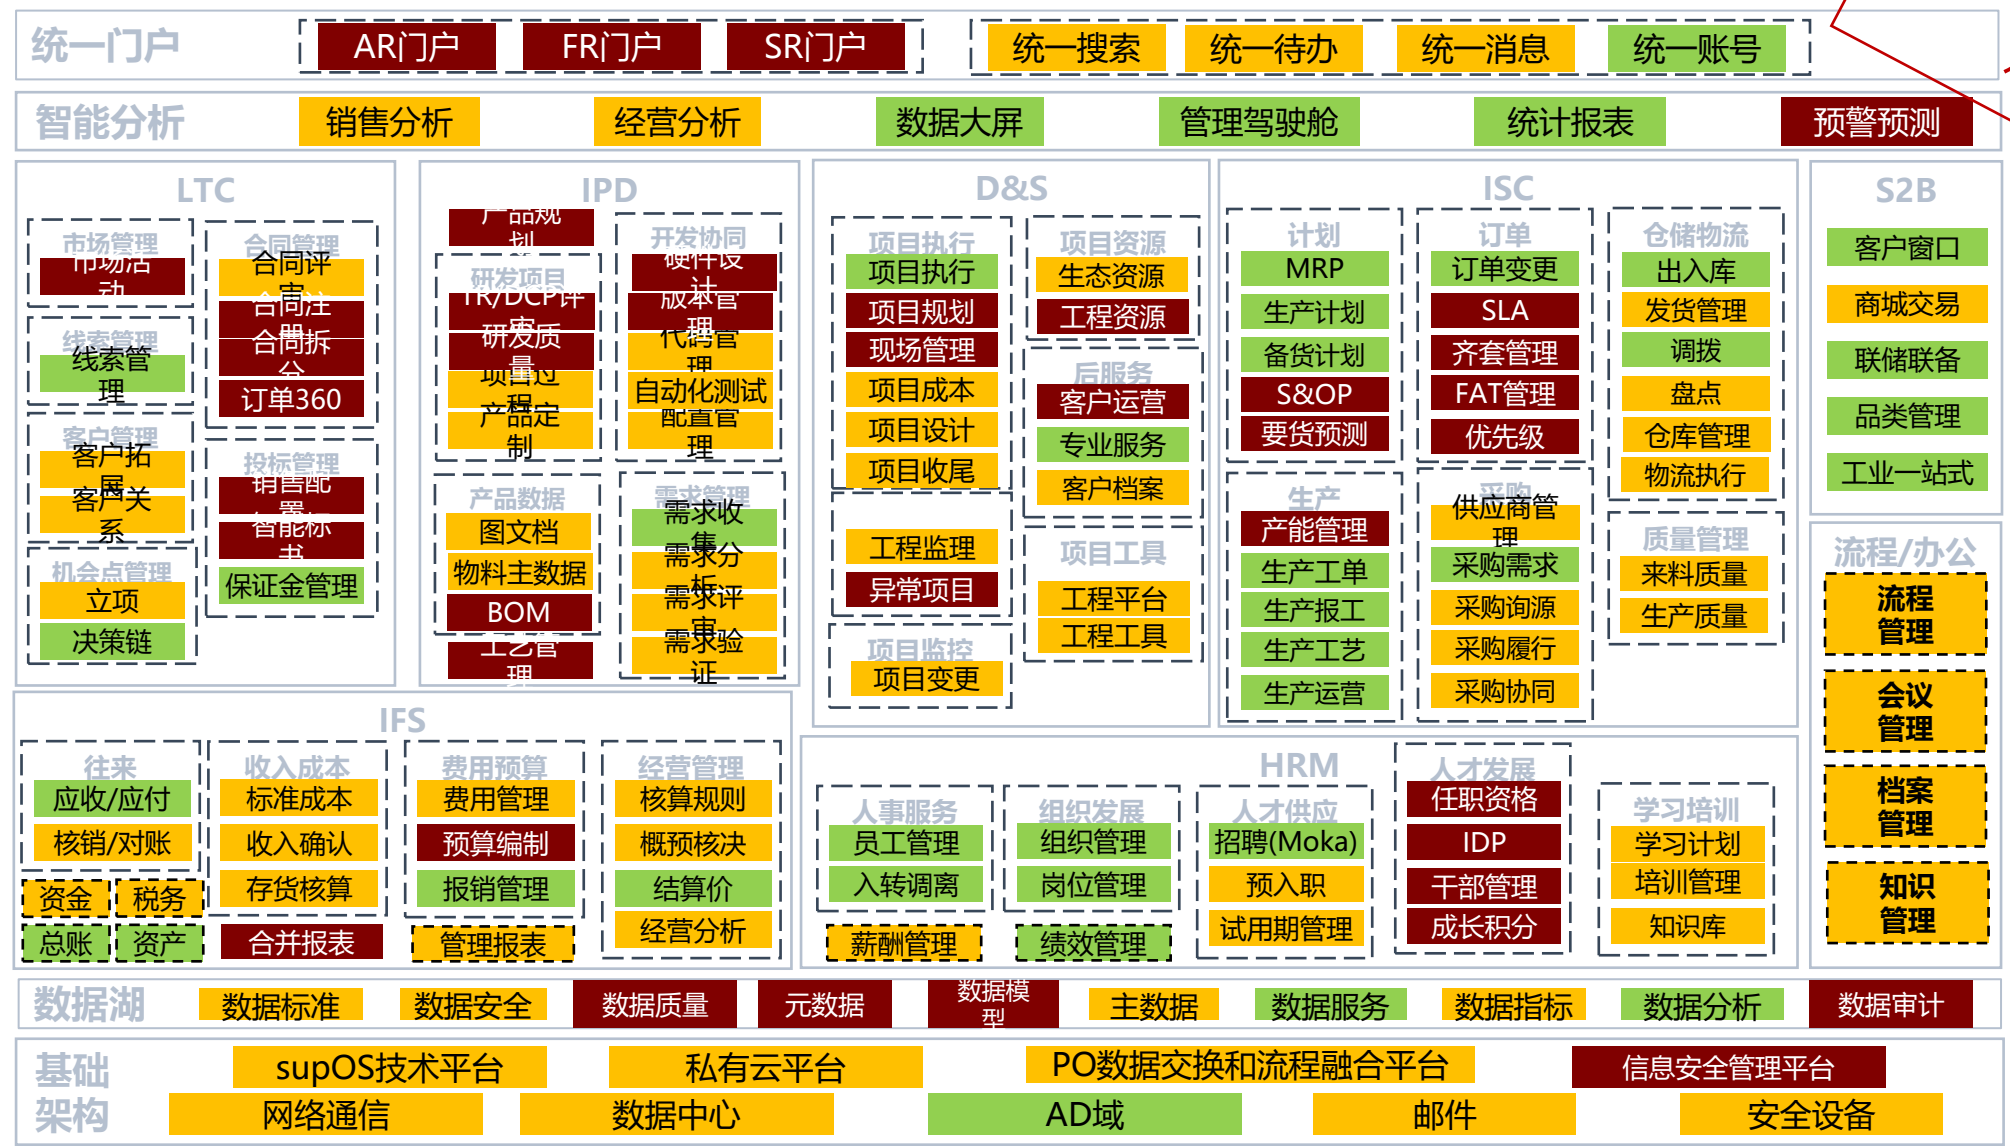

通过业务、数据、应用、技术解构产品，基于核心要素结构化、可视化，实现快速交付

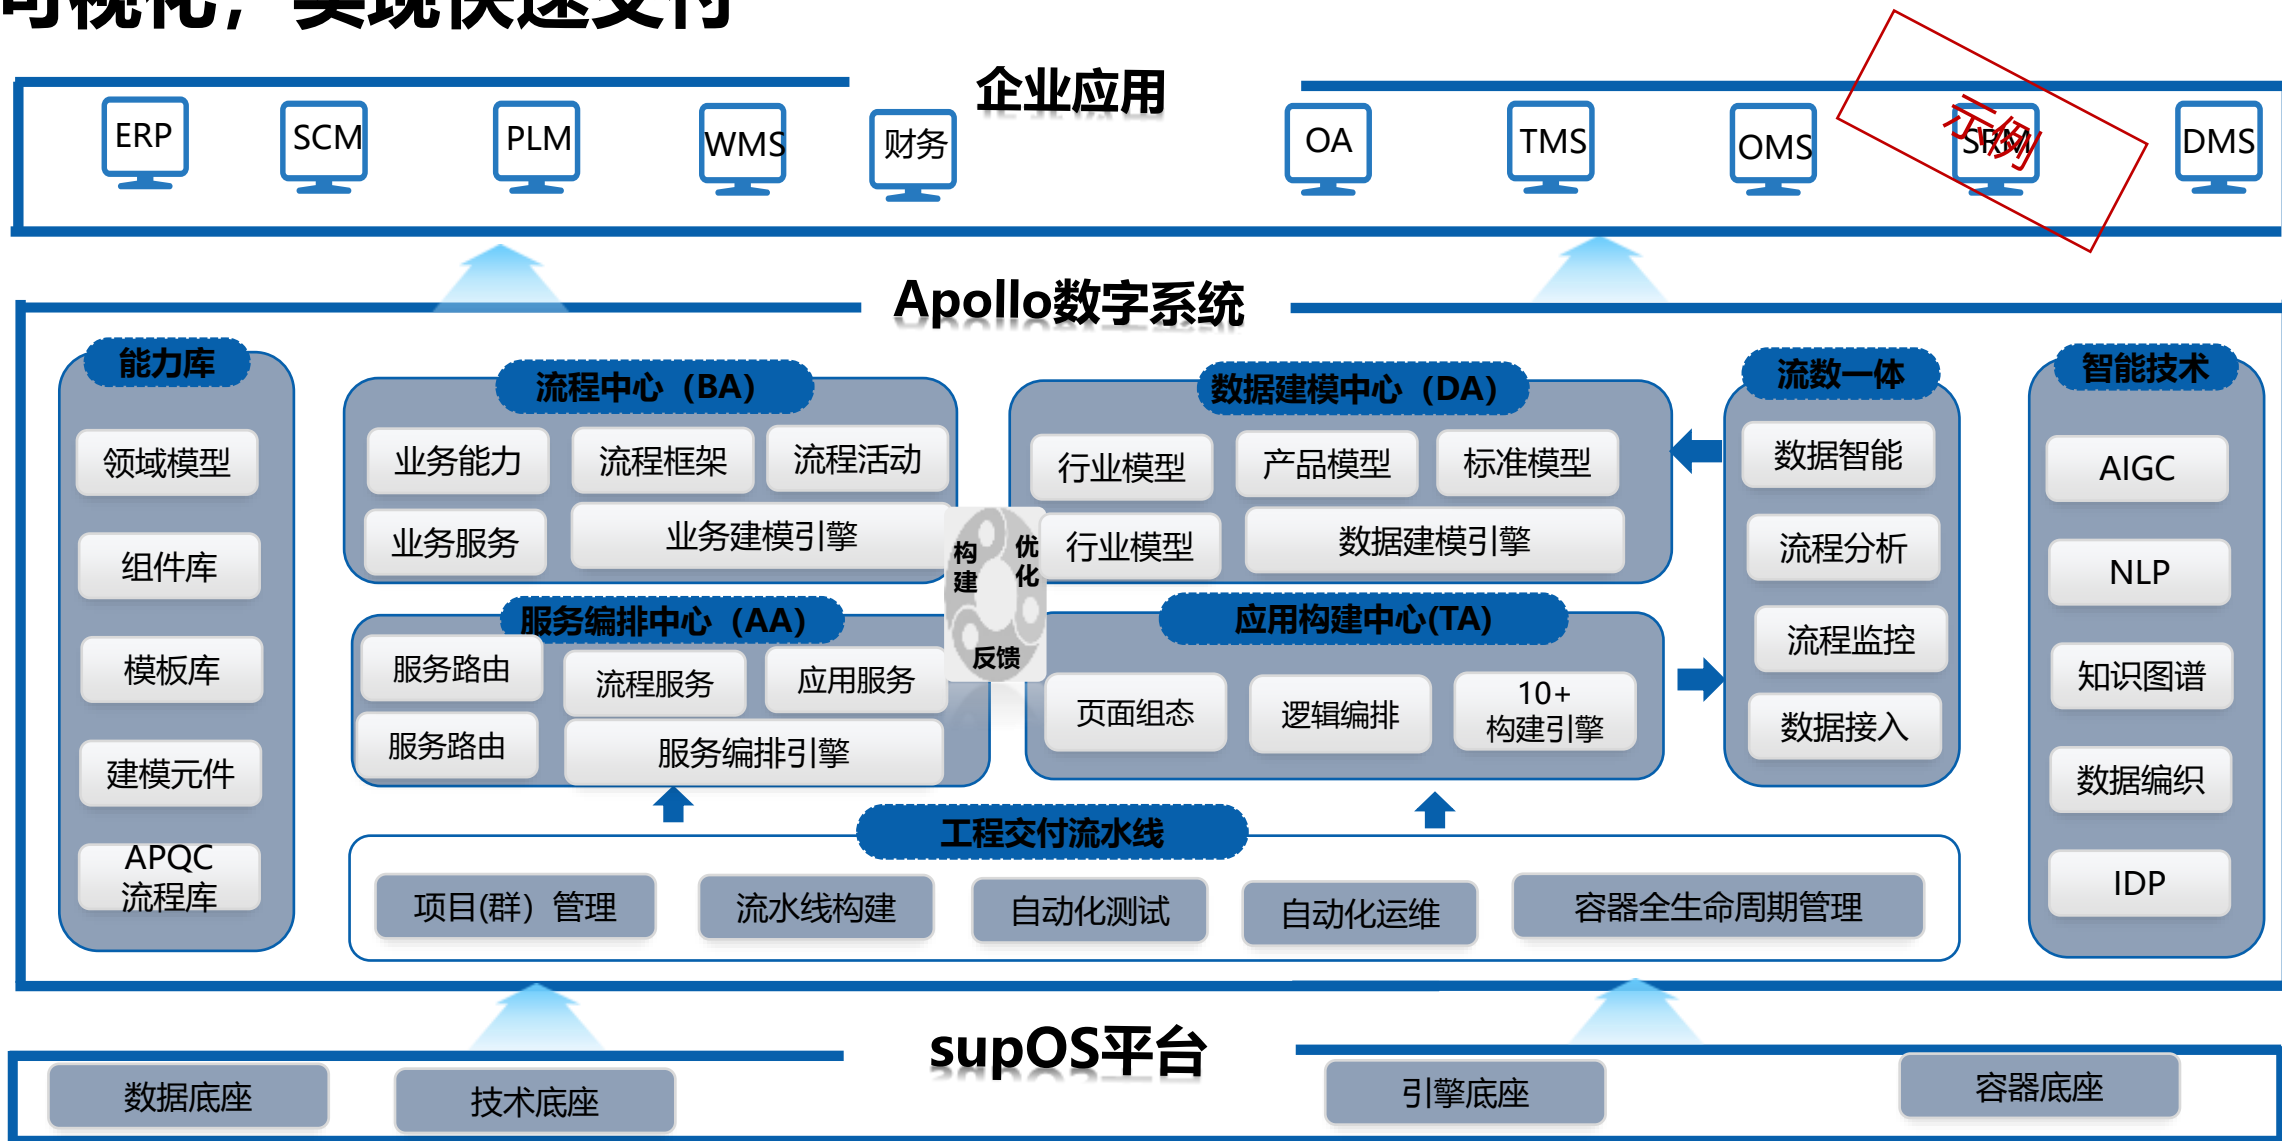


基于相关应用功能缺失项，统筹考虑，识别相关举措，基于举措形成数字化项目进行推进



序号	举措	项目	描述	项目经理	项目经理态度	预算(万元)(不含业务)	其中，IT人力投入(万元)	其中，外购费用(万元)
1	以客户为中心，实现内部（工程、销售、研发、供应链、供应商）有效协同	订单管理&履行系统	项目供应方案、订单交付风险、订单管理、订单策略、订单批次、齐套单、订单计划、订单承诺、FAT/发货计划、发货指令		示例			
2		供应链&研发共同提升	版本切换计划、ESS计划，计划做在控制系统产品部的研发管理平台系统上					
3		研发物资仓库管理项目	通过对JS57库以及8009研发工厂物资出入库的改造，实现对研发物资的仓库话管理，同时在线上启用对纵向经费的管理，快速识别使用纵向经费的采购项目					
5	持续提升交付能力，实现降本增效	质量追溯管理	通过搭建质量管理体系，实现对制造质量的管控，同时在采购端增加原厂物资追溯以及建立客户质量追溯档案实现从源头到交付的全过程质量可追溯管理					
6		TMS运输管理系统	1.已完成系统招投标，通过外部实施方完成对运单的拆合单、装箱打包、集成清点、波次管理、场内物流、承运商结算管理等场景的管理。					

基于数字化举措和项目，在考虑预算的前提下，结合公司战略规划，形成数字化项目路标

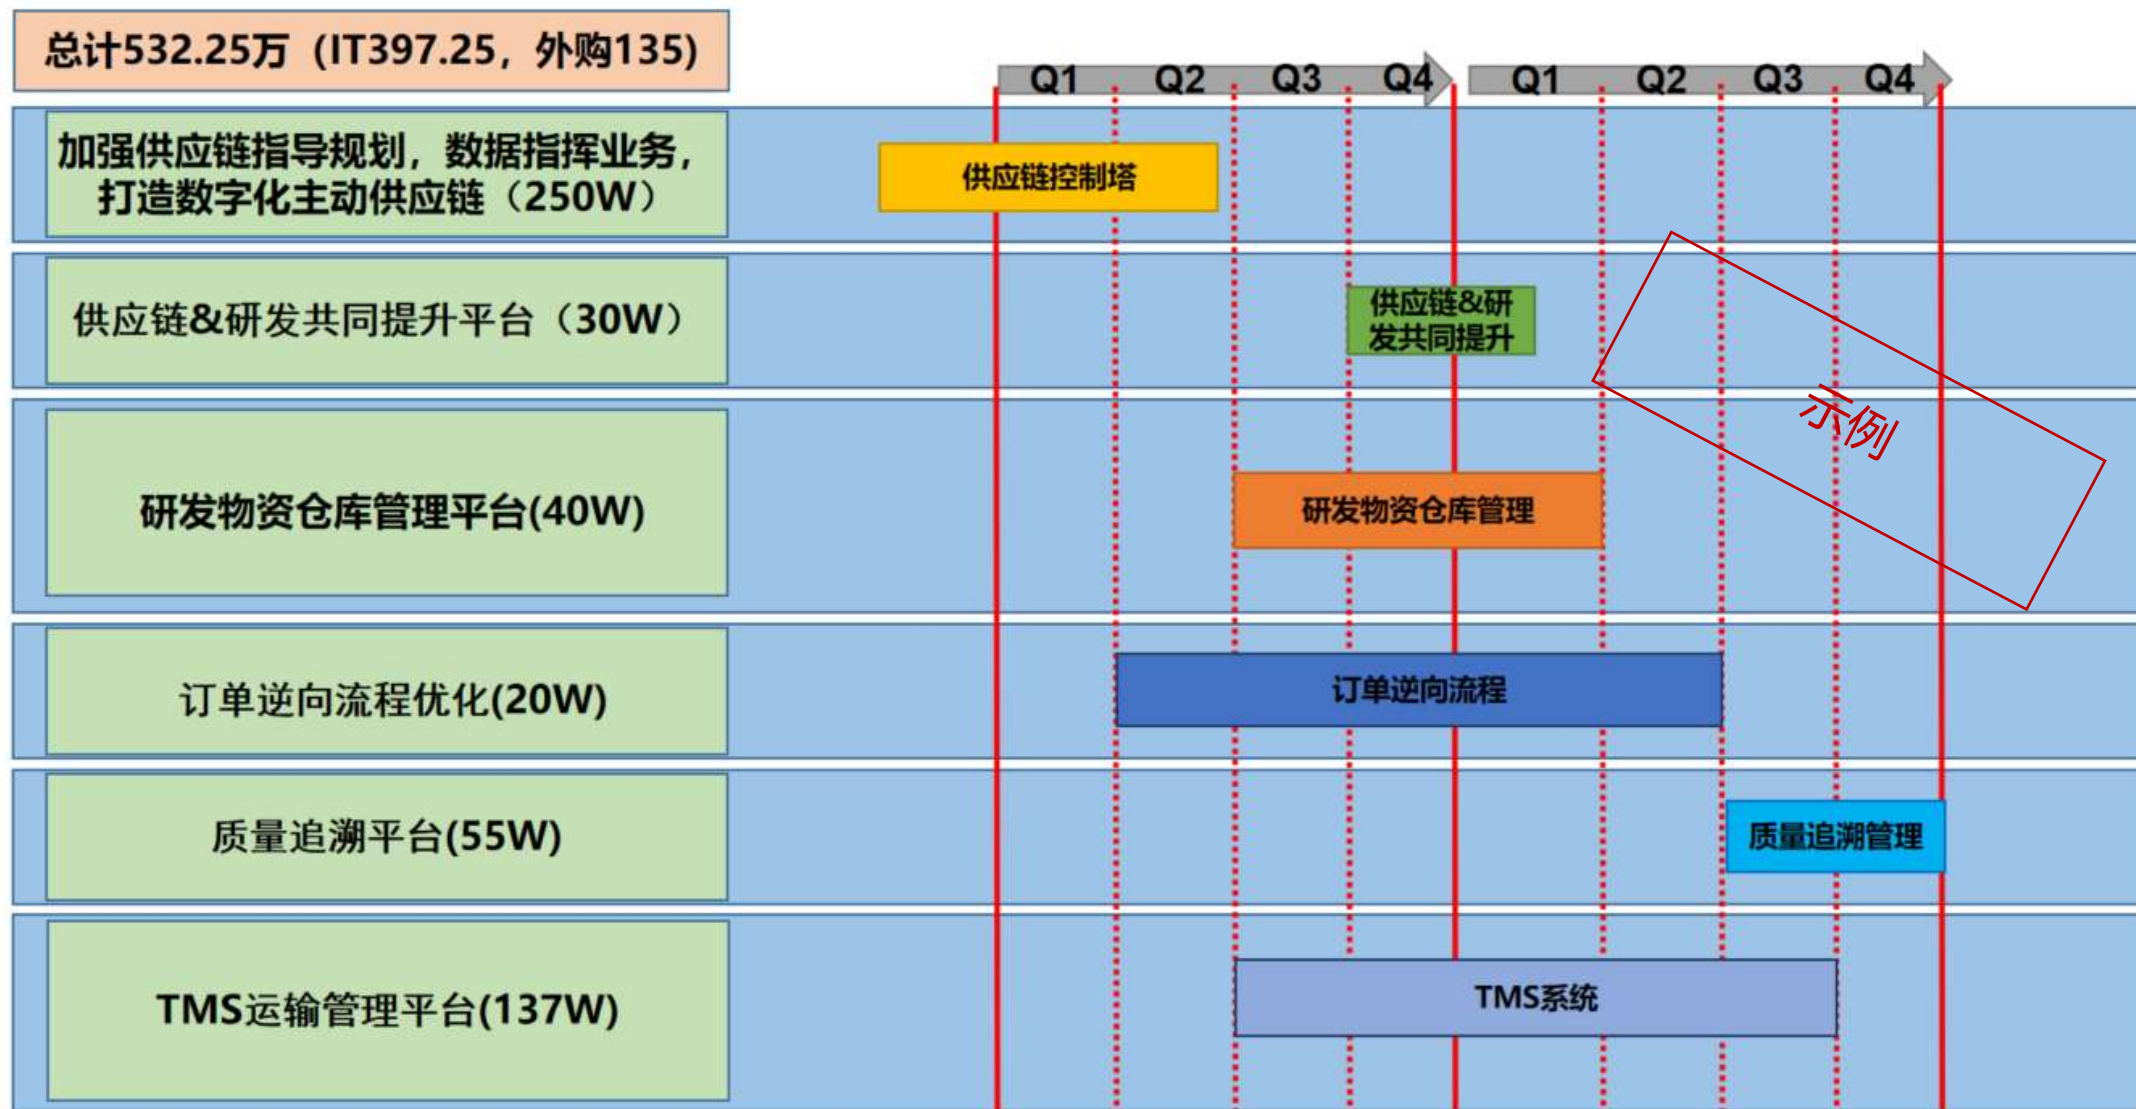

02

数字化集成 解决方案开 发流程框架



云南白药数字化集成解决方案开发流程价值



云南白药数字化集成解决方案开发流程指导原则

客户优先原则

- 业务变革、流程IT设计必须以客户价值为中心，改进各流程以满足客户需求和提升公司业务运作效率，支撑公司卓越运营，优先聚焦主业务流程

战略导向原则

- 承接企业战略规划，支撑战略落地
- 掌握变革节奏

全局最优原则

- 局部优化要促进全局优化，保证业务变革端到端的效率提升



数字化集成解决方案开发流程管理运作流程与机制的目的


- ☑ 规范变革项目的**项目管理**过程，保证变革项目遵循一定的工作方法，
确保项目的**质量**、管控**项目进度**，保障变革项目有效规范运行。

范围


- ☑ 适用于中控变革项目**全阶段管理活动**。

在流程架构上厘清变革与数字化转型、MBT&DT流程之间的关系

- 变革项目与优化项目是数字化转型业务运作的重要载体。

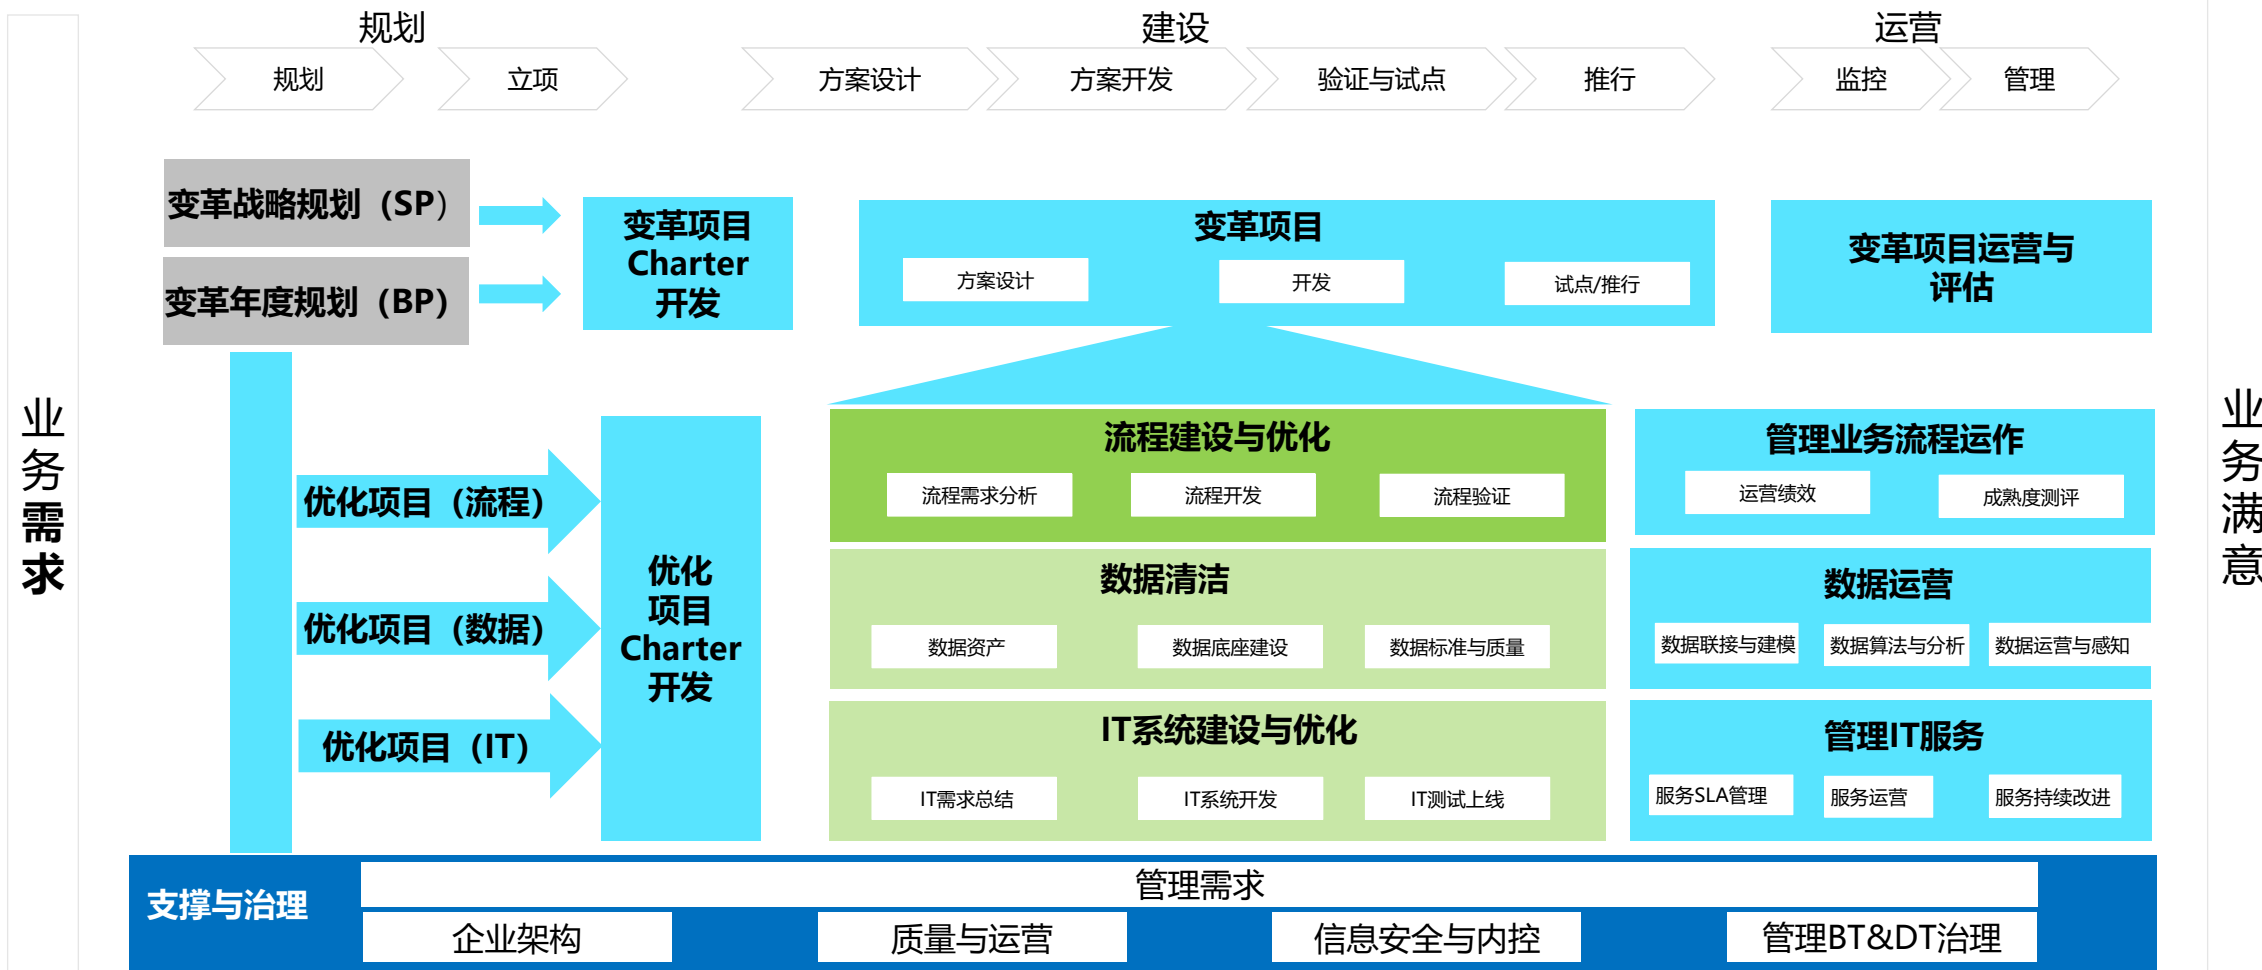

数字化集成解决方案开发流程管理里程碑步骤及关键评审事项

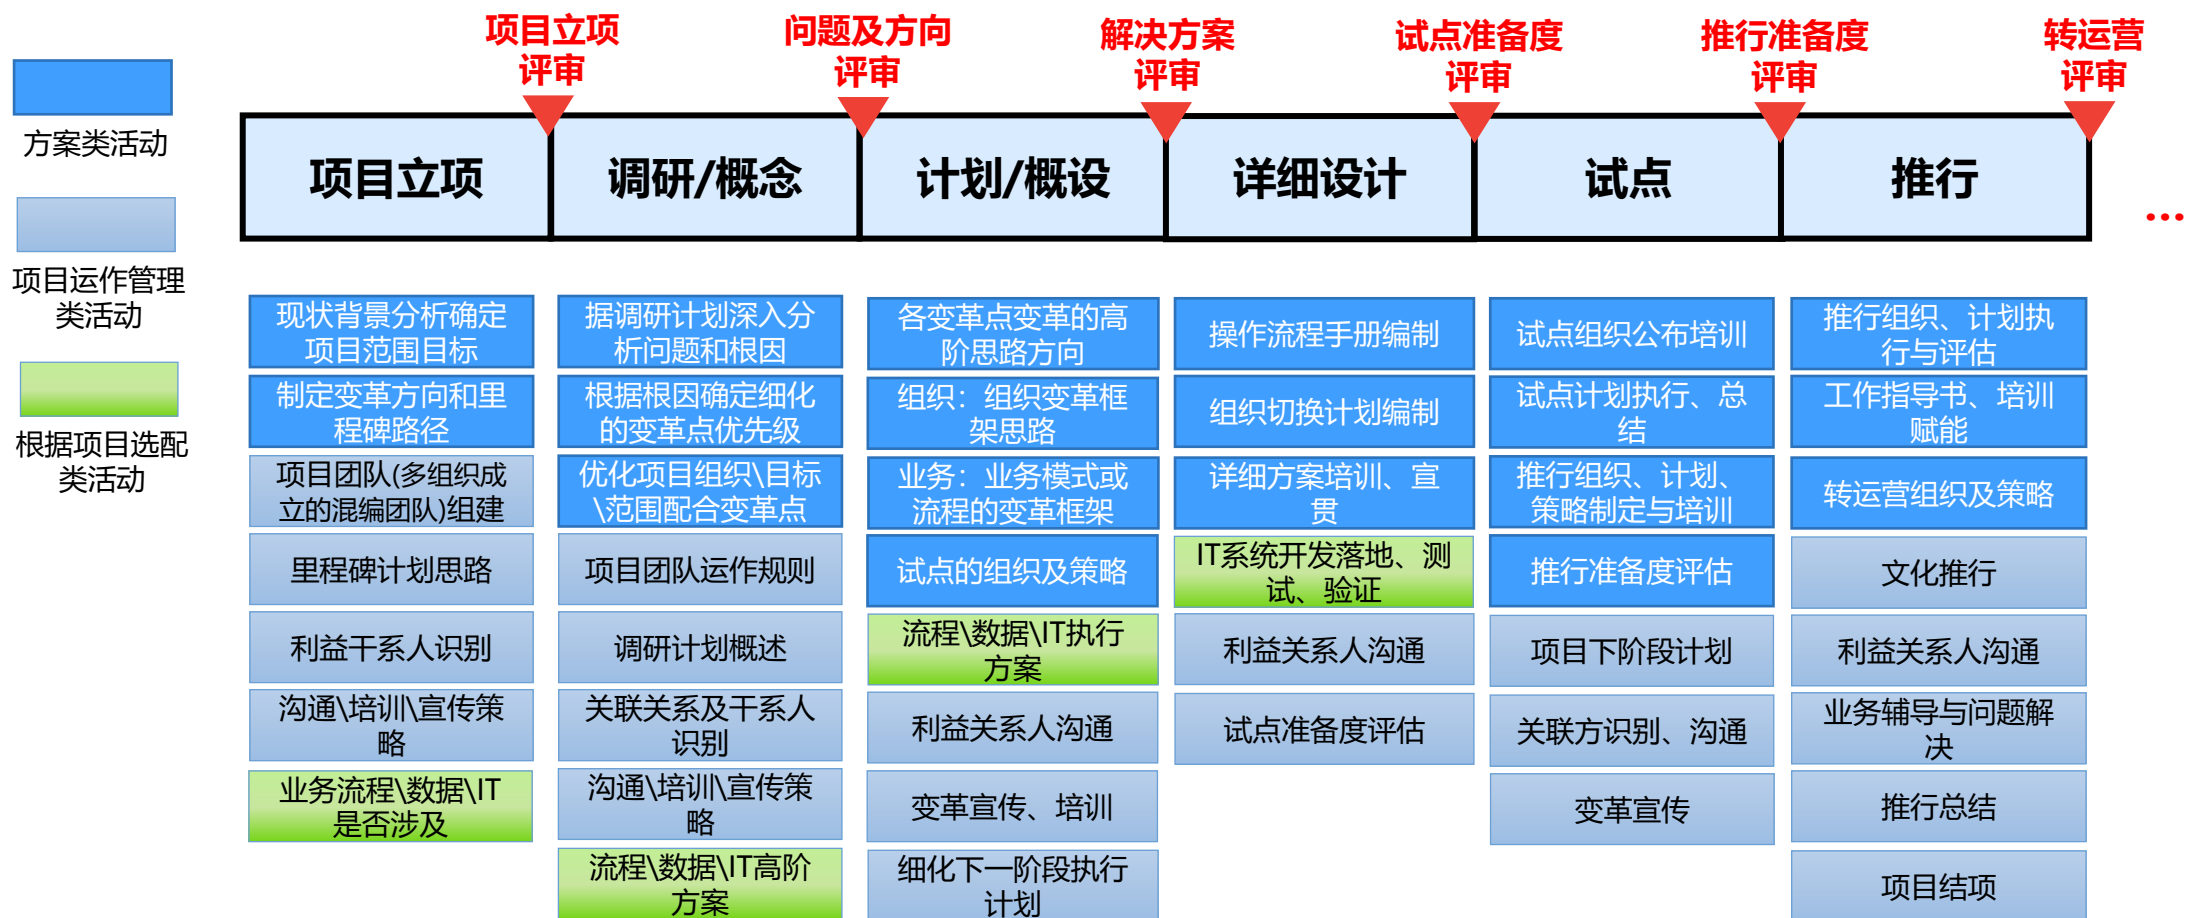

开发阶段采用敏捷方式进行管理

产品需求池

排定需求优先级及迭代周期，填写验收标准及上传需求方案

迭代计划

PO组织需求评审会，澄清需求并拆分用户故事，SM填写故事点，迭代任务拆解并指派任务

迭代执行

开发、测试人员日常更新日志和工时，记录消耗工时和剩余工时

任务跟踪


每日站会查看任务看板，跟进需求执行情况和bug信息，燃尽图展示整体工作进度

总结验收


SM组织迭代评审会，研发团队将已测试完毕的需求进行演示，由PO验收及提供反馈，反馈记录到产品研发需求中



The screenshot displays a web-based interface for managing tasks. It features a sidebar on the left with navigation options like '我的任务' (My Tasks), '我的项目' (My Projects), and '我的团队' (My Team). The main area shows a table of tasks with columns for '任务名称' (Task Name), '任务描述' (Task Description), '任务状态' (Task Status), '任务负责人' (Task Owner), '任务开始时间' (Task Start Time), and '任务结束时间' (Task End Time). The tasks are listed in a grid, with each row representing a specific task and its associated details.

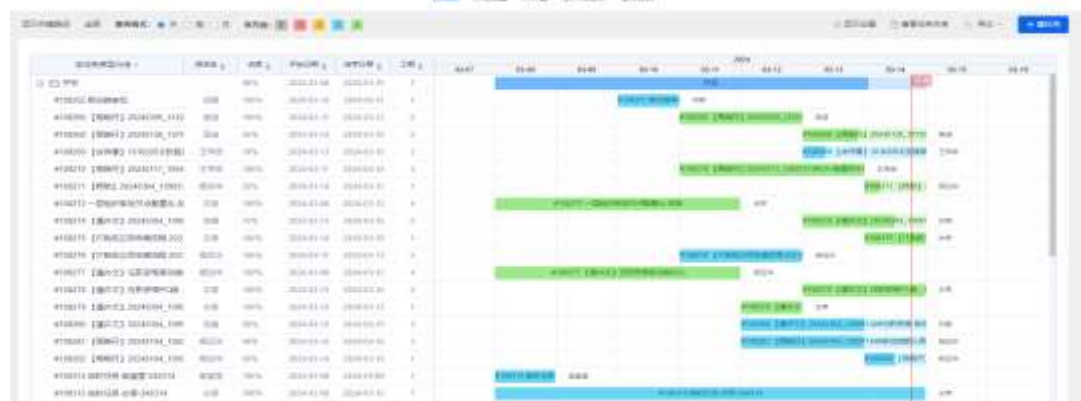


云南白药数字化集成解决方案开发流程框架建议

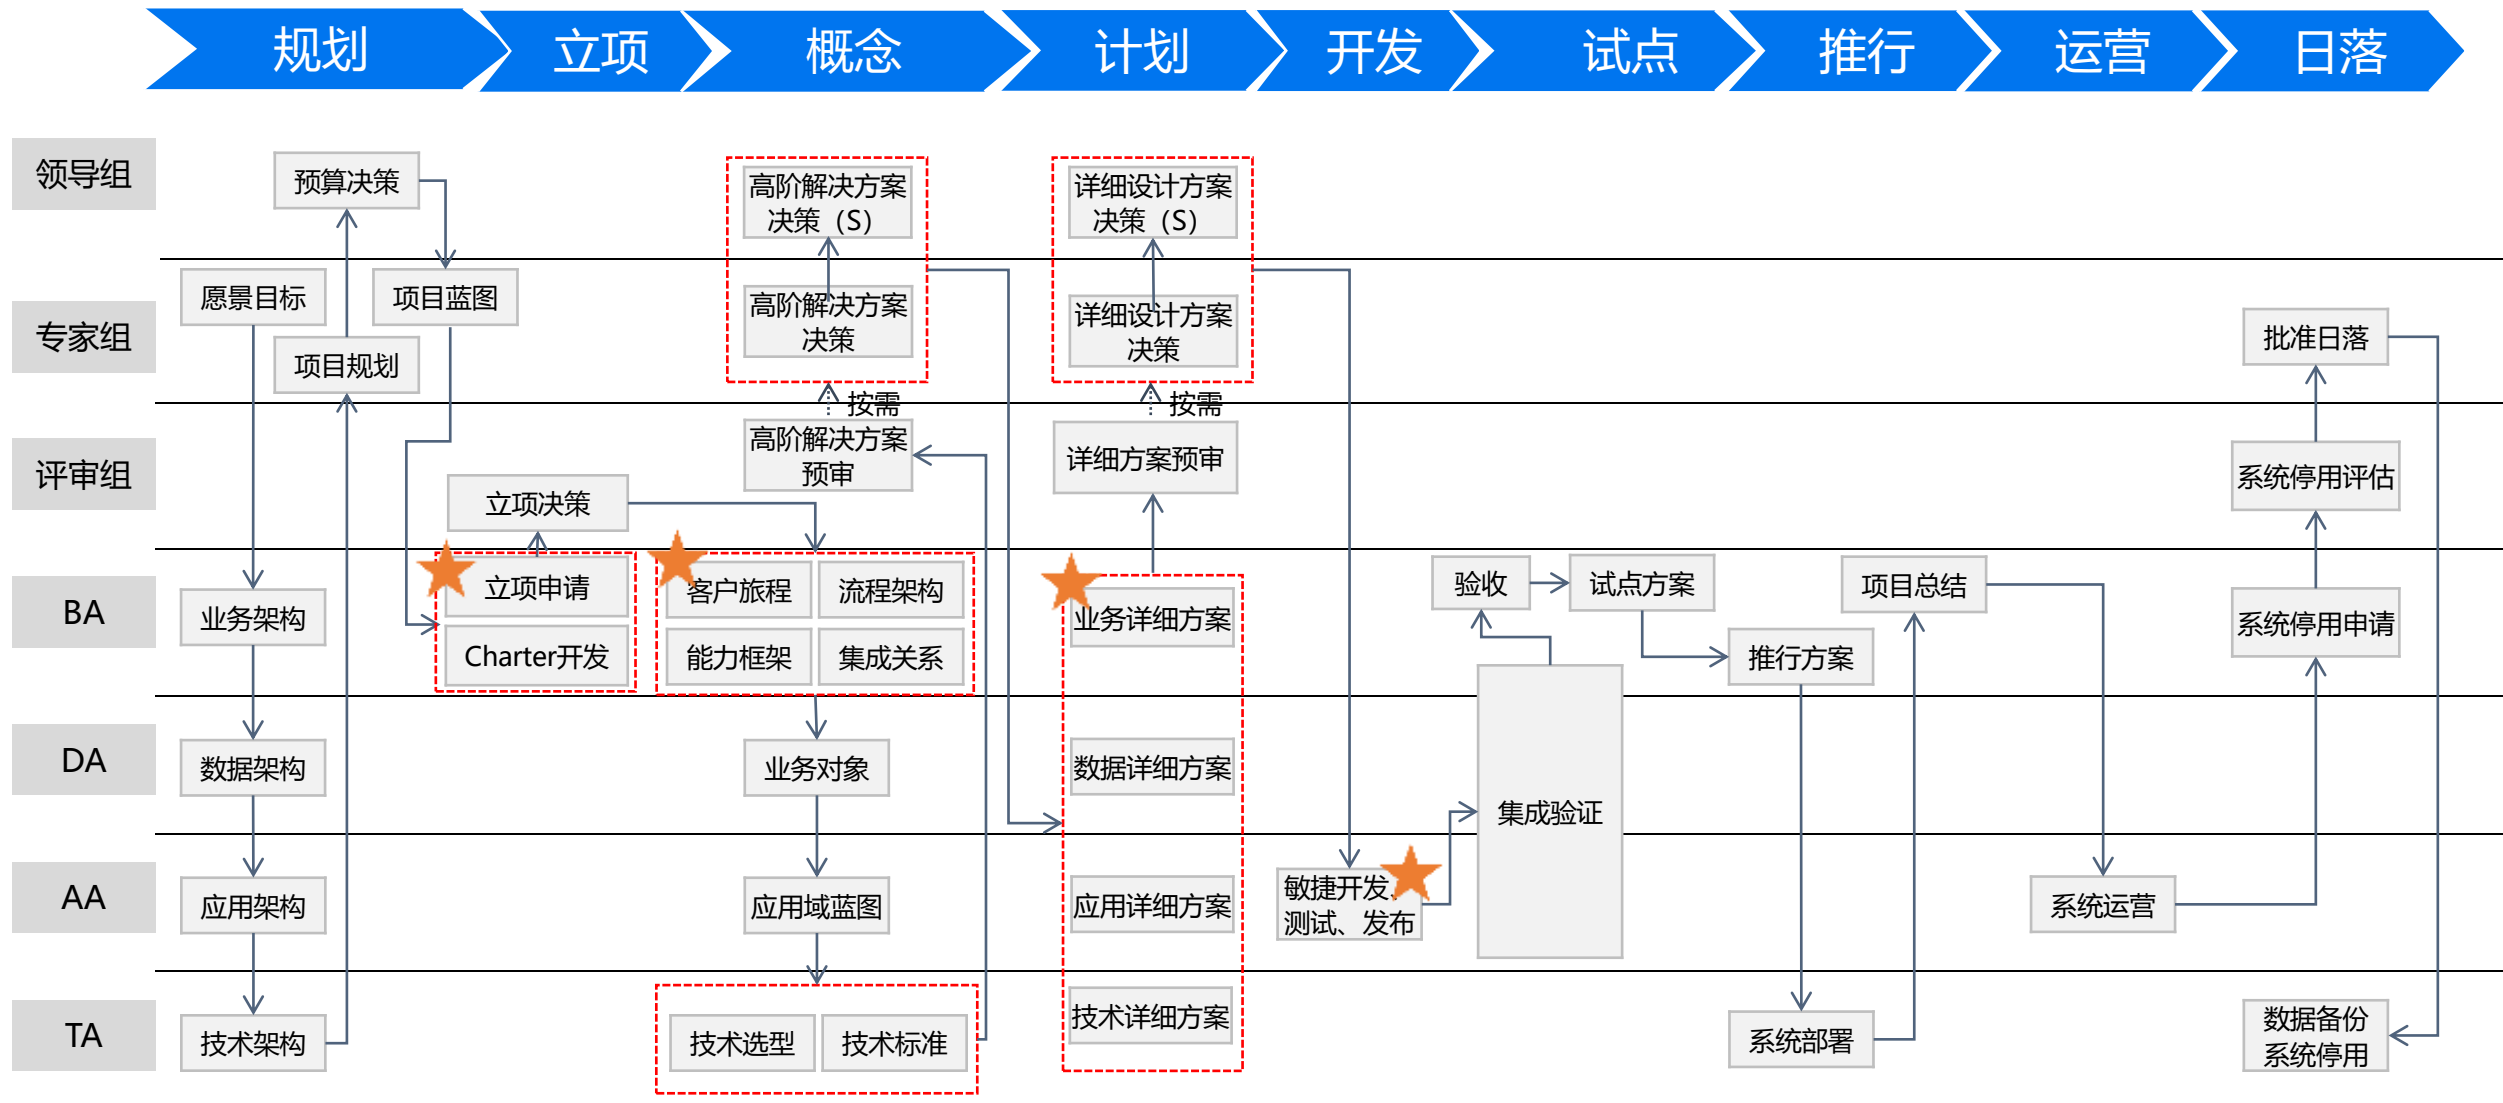

重新定位IT，视IT为投资，实现从立项到日落的IT产品全生命周期管理，在整个过程中4A（业务、数据、应用、技术）需紧密协同。项目成功的关键要素在于Charter材料、高阶方案、详细方案和敏捷开发交付。

云南白药数字化集成解决方案开发流程 核心要点

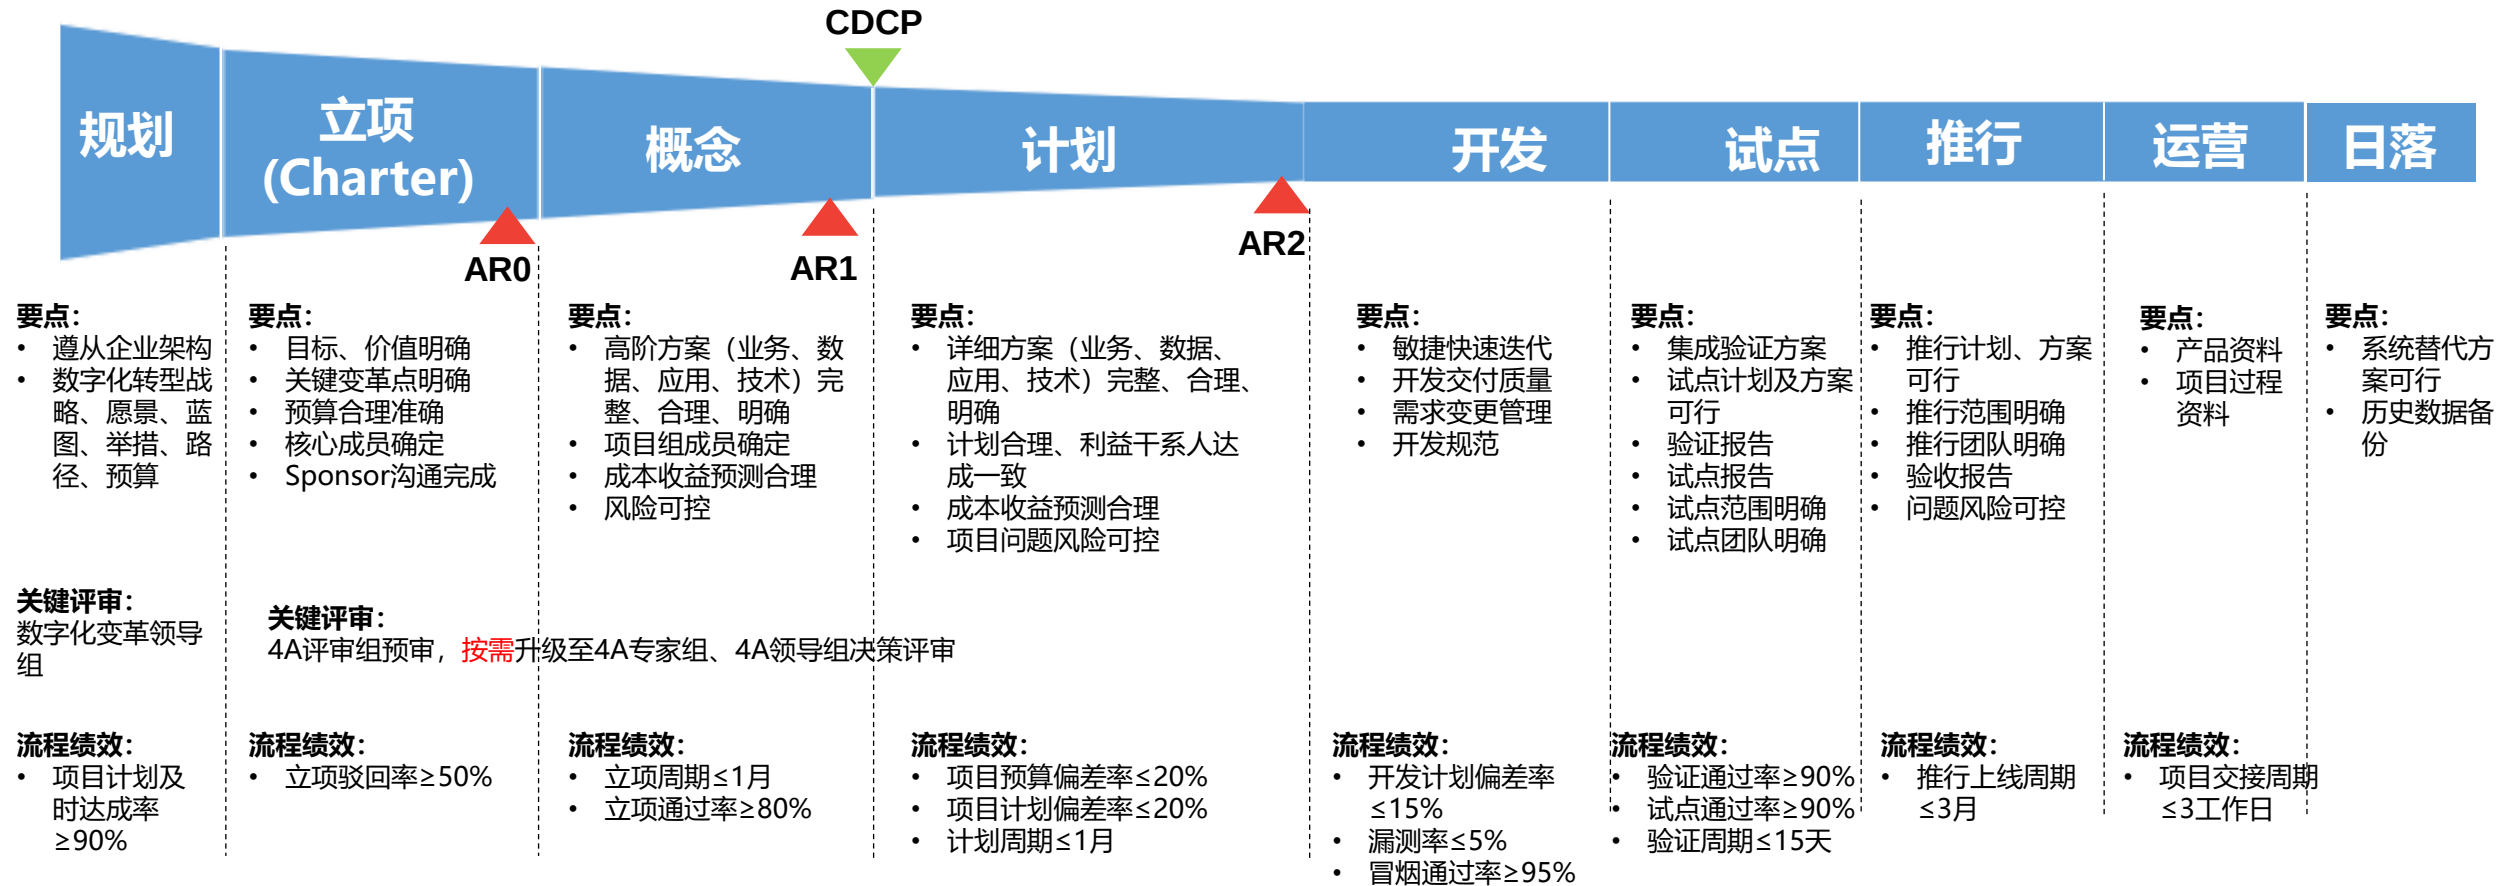

项目分级原则

- S级：项目投入≥500万 或 跨一级流程且项目投入≥300万
- A级：300W≤项目投入<500W 或 跨一级流程且100W≤项目投入<300W
- B级：100W≤项目投入<300W 或 跨一级流程且50W≤项目投入<100W
- C级：实施工作量≥30人天

03

顾问资源 投入保障



云南白药变革项目模块报价及资源规划

2024年云南白药变革项目模块报价及资源规划表											
项目	序号	项目周期	模块	总裁级顾问	高级顾问	中级顾问	人天小计	未税目录总价	未税战略总价	含税目录总价	含税战略总价
				宋维原	宗鑫磊	高子惠		(单位: 万)	(单位: 万)	(单位: 万)	(单位: 万)
云南白药变革项目	1	2024.4月下旬-5月上旬 (2周完成)	用户调研	2	2	2	6.0	152000.00	121600.0000	161120.00	128896.0000
				2	2.0	2.0					
	2		数字化集成解决方案开发流程	2	3.5	3.5	20.0	334000.00	267200.0000	354040.00	283232.0000
			中药材领域IT规划	2	9	9					
	小计 (2023年)				4	11	11	26	486000.00	388800.00	515160.00

1

[illegible]

流程变革铸就企业管理根基

◆ 总机：025-82210187

◆ 联系人：ALEX：13851487716

◆ 地址：南京市建邺区南京市建邺区国秀广场5栋悦星球519室
